DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CẢNG TIÊN SA (GIAI ĐOẠN II)

GÓI THẦU XL: XÂY DỰNG CẦU CẢNG, NẠO VÉT KHU NƯỚC TRƯỚC BẾN

ĐƯỜNG CONG KẾ HOẠCH THI CÔNG

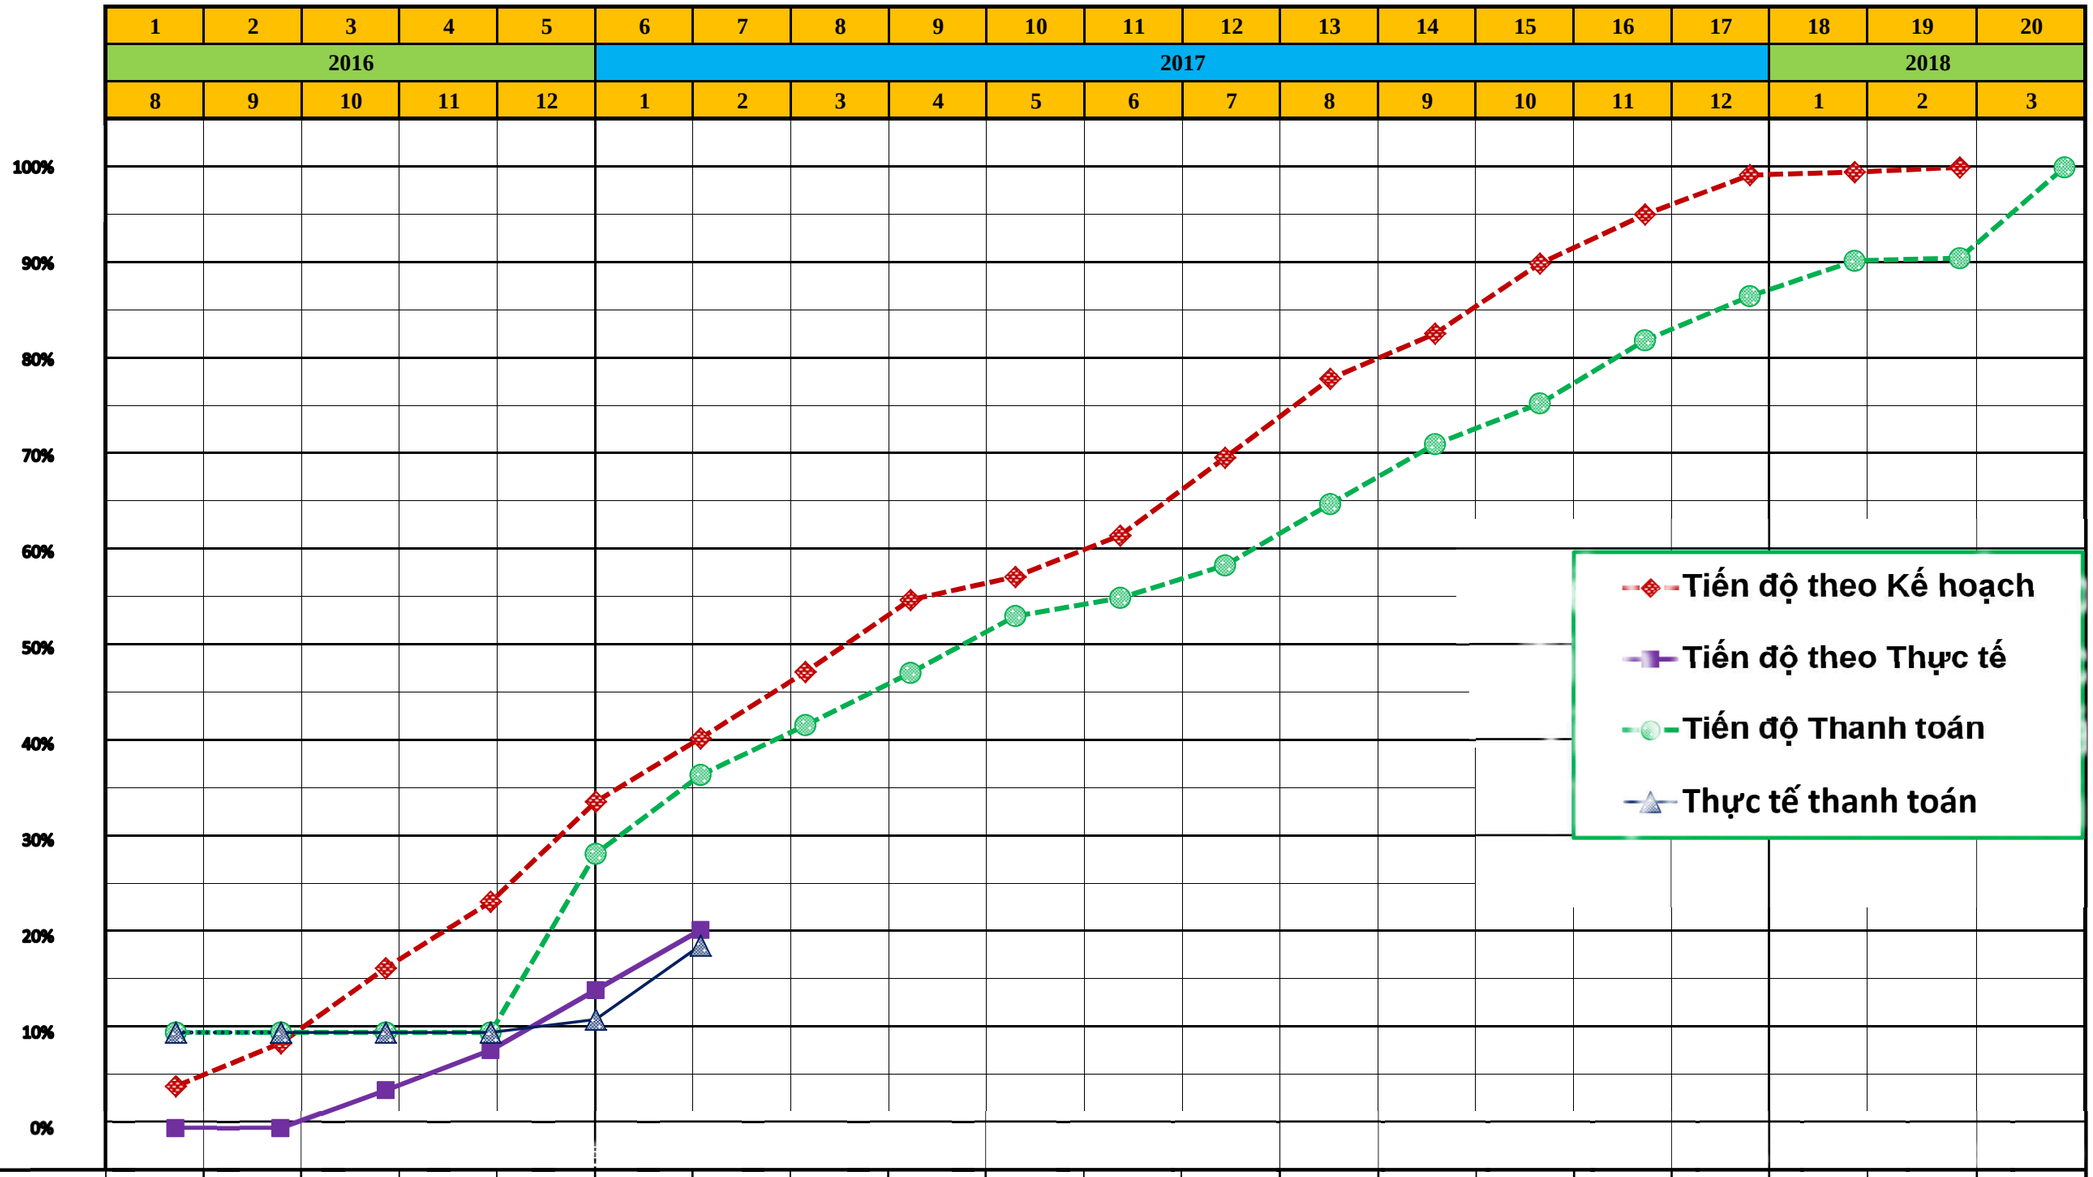

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2016					2017												2018		
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Tiến độ theo Kế hoạch	Tiến độ Tháng (%)	1.300%	3.100%	4.500%	7.800%	6.900%	10.400%	6.600%	6.900%	7.500%	2.400%	4.300%	8.100%	8.200%	4.700%	7.300%	5.100%	4.100%	0.300%	0.500%	
	Tiến độ Tích lũy (%)	1.300%	4.400%	8.900%	16.700%	23.600%	34.000%	40.600%	47.500%	55.000%	57.400%	61.700%	69.800%	78.000%	82.700%	90.000%	95.100%	99.200%	99.500%	100.000%	
Tiến độ theo Thực tế	Tiến độ Tháng (%)			3.990%	4.170%	6.250%	6.250%														
	Tiến độ Tích lũy (%)	-		3.990%	8.160%	14.410%	20.660%														
Kế hoạch Thanh toán	Kế hoạch Tháng (%)	10.00%					18.585%	8.190%	5.198%	5.434%	5.906%	1.890%	3.386%	6.379%	6.233%	4.230%	6.570%	4.590%	3.690%	0.270%	9.450%
	Kế hoạch Tích lũy (%)	10.000%	10.000%	10.000%	10.000%	10.000%	28.585%	36.775%	41.972%	47.406%	53.312%	55.202%	58.589%	64.967%	71.200%	75.430%	82.000%	86.590%	90.280%	90.550%	100.000%
Thực tế Thanh toán	Thực tế Tháng (%)	10%				1.356%	7.697%														
	Thực tế Tích lũy (%)	10.000%	10.000%	10.000%	10.000%	11.356%	19.053%														
