DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CẢNG TIÊN SA (GIAI ĐOẠN II)
GÓI THẦU XL: XÂY DỰNG CẦU CẢNG, NẠO VÉT KHU NƯỚC TRƯỚC BẾN
KẾ HOẠCH THI CÔNG VÀ GIẢI NGÂN

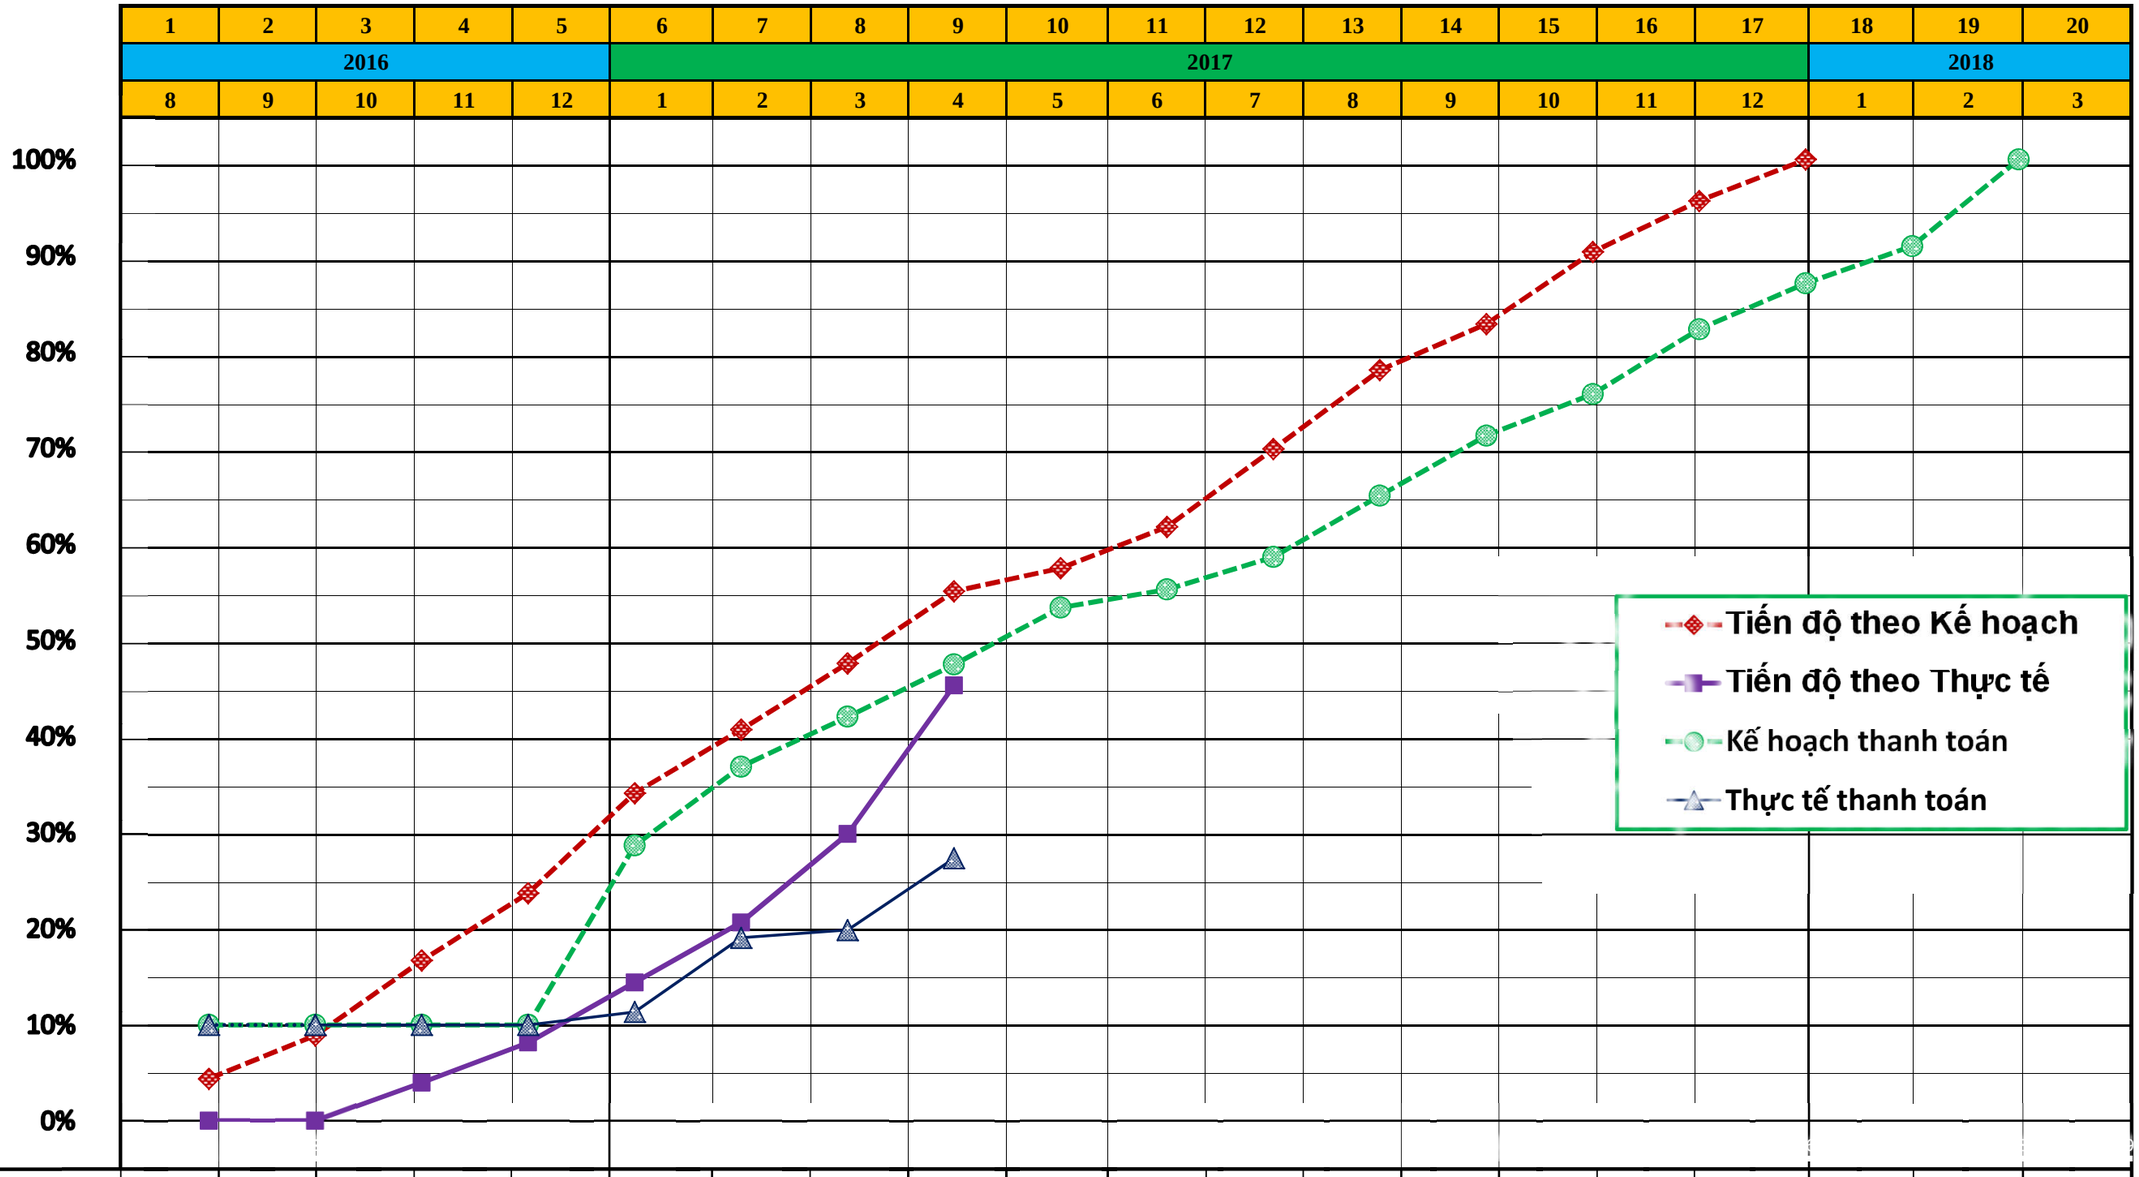

Tiến độ theo Kế hoạch	Tiến độ Tháng (%)	1.300%	3.100%	4.500%	7.800%	7.000%	10.400%	6.600%	6.900%	7.500%	2.400%	4.300%	8.100%	8.200%	4.800%	7.500%	5.300%	4.300%			
	Tiến độ Tích lũy (%)	1.300%	4.400%	8.900%	16.700%	23.700%	34.100%	40.700%	47.600%	55.100%	57.500%	61.800%	69.900%	78.100%	82.900%	90.400%	95.700%	100.000%			
Tiến độ theo Thực tế	Tiến độ Tháng (%)			3.990%	4.170%	6.250%	6.250%	9.201%	15.451%												
	Tiến độ Tích lũy (%)	-		3.990%	8.160%	14.410%	20.660%	29.861%	45.313%												
Kế hoạch Thanh toán	Kế hoạch Tháng (%)	10.00%					18.664%	8.190%	5.198%	5.434%	5.906%	1.890%	3.386%	6.379%	6.244%	4.320%	6.750%	4.770%	3.870%	9.000%	
	Kế hoạch Tích lũy (%)	10.000%	10.000%	10.000%	10.000%	10.000%	28.664%	36.854%	42.051%	47.485%	53.391%	55.281%	58.667%	65.046%	71.290%	75.610%	82.360%	87.130%	91.000%	100.000%	
Thực tế Thanh toán	Thực tế Tháng (%)	10%				1.356%	7.697%	0.816%	7.465%												
	Thực tế Tích lũy (%)	10.000%	10.000%	10.000%	10.000%	11.356%	19.053%	19.868%	27.334%												
